



CITTA' DI TERMINI IMERESE

PROVINCIA DI PALERMO

URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA A MARE DEL CENTRO STORICO:
PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - SS. 113

PROGETTO ESECUTIVO

ataengineering

via Alto Adige, 160 38121 Trento - Italy
tel. +39 0461.1731000 - fax +39 0461.1731052
www.ataengineeringspa.com - info@ataengineeringspa.com
c.fiscate, p.iva e R.L. Trento 01307610228



CAPOGRUPPO MANDATARIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. ERINO BOMBARDELLI
ISCRIZIONE ALEO N. 1098

SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.

SEDE: Padova - 35030 Sarmeola di Rubano - Via della Provvidenza, 13 - tel. +39 049 8976944 - fax +39 049 8976784
FILIALE: Belluno 32100 - Via degli Agricoltori, 13 - tel. +39 0437 355411 - fax +39 0437 355412
UFFICI IN ITALIA: Milano - Napoli - Ancona - Sassari
UFFICI ALL'ESTERO: Pechino (Cina) - Cairo (Egitto) - Podgorica (Montenegro) - Salaymaniya (Iraq)
www.sgi-spa.it - info@sgi-spa.it



MANDANTE



Dott. Ing. Fiorella Scalia

STUDIO TECNICO
PIAZZA S. ANTONIO N.16
90018 TERMINI IMERESE (PA)
TEL. 091 8115583 FAX 091 8110748
E-Mail: fiorella.scalia@tin.it
P. IVA 04315120826


MANDANTE



Dott. Ing. Filippo Carcara

STUDIO TECNICO
VIA SAFFO 2b
90151 PALERMO
TEL. 392 9820063 E-Mail filcar@lilbero.it
P. IVA 0052316810


MANDANTE



Dott. Geol. Giuseppe Franzò

STUDIO
90010 ISNELLO (PA) c.da PONTICELLO
TEL./FAX 0921 662849 E-Mail peppefranzo@lilbero.it
P. IVA 02948160821

MANDANTE



DATA: **MAGGIO 2018**

TAVOLA:


CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

N.ro allegato **1.8.9**

3	A. AMADORI	E. BOMBARDELLI	E. BOMBARDELLI		AGGIORNAMENTO LISTINO PREZZI 2018	31.05.2018
2	A. AMADORI	E. BOMBARDELLI	E. BOMBARDELLI		ADEGUAMENTO RAPPORTO DI VERIFICA	06.10.2017
REV.	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																						
CATEGORIE DI LAVORO	DISTRIBUZIONE MENSILE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DEI LAVORI (in Euro)																					TOTALE CATEGORIA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
A) ROTATORIA OVEST	151.490,02	151.490,02	75.745,01																			378.725,06
B) ASTA PRINCIPALE SEZ. 1+70			245.831,11	491.662,22	491.662,22	491.662,22	491.662,22	491.662,22	491.662,22	245.831,11												3.441.635,55
Rafforzamento Corticale				584.383,95	584.383,95																	1.168.767,89
C) ASTA PRINCIPALE SEZ. 70+78											392.417,06	392.417,06	196.208,53									981.042,64
D) SOTTOPASSO FERROVIARIO													831.260,12	831.260,12	831.260,12	831.260,12	831.260,12	831.260,12				4.156.300,59
L) IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO																	96.538,54	96.538,54				193.077,08
E) ASTA PRINCIPALE SEZ. 90+109																			195.291,67	195.291,67		390.583,34
F) ROTATORIA EST																			143.365,87	143.365,87		286.731,74
G) ASTA A-A'																				89.917,27		89.917,27
H) ASTA E-E'									89.348,70	89.348,70												178.697,40
I) PERCORSO PEDONALE																			156.124,14	156.124,14		312.248,28
M) SOTTOSERVIZI						16.899,07	16.899,07	16.899,07	16.899,07													67.596,26
PARZIALI MESE	151.490,02	151.490,02	321.576,12	1.076.046,17	1.076.046,17	508.561,29	508.561,29	508.561,29	508.561,29	335.179,81	89.348,70	392.417,06	392.417,06	1.027.468,65	831.260,12	831.260,12	831.260,12	927.798,66	96.538,54	351.415,81	494.781,68	233.283,14
PROGRESSIVI	151.490,02	302.980,05	624.556,17	1.700.602,34	2.776.648,50	3.285.209,79	3.793.771,08	4.302.332,36	4.810.893,65	5.146.073,46	5.235.422,16	5.627.839,22	6.020.256,27	7.047.724,92	7.878.985,04	8.710.245,15	9.541.505,27	10.469.303,93	10.565.842,47	10.917.258,28	11.412.039,96	11.645.323,10
MESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

DISTRIBUZIONE MENSILE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO

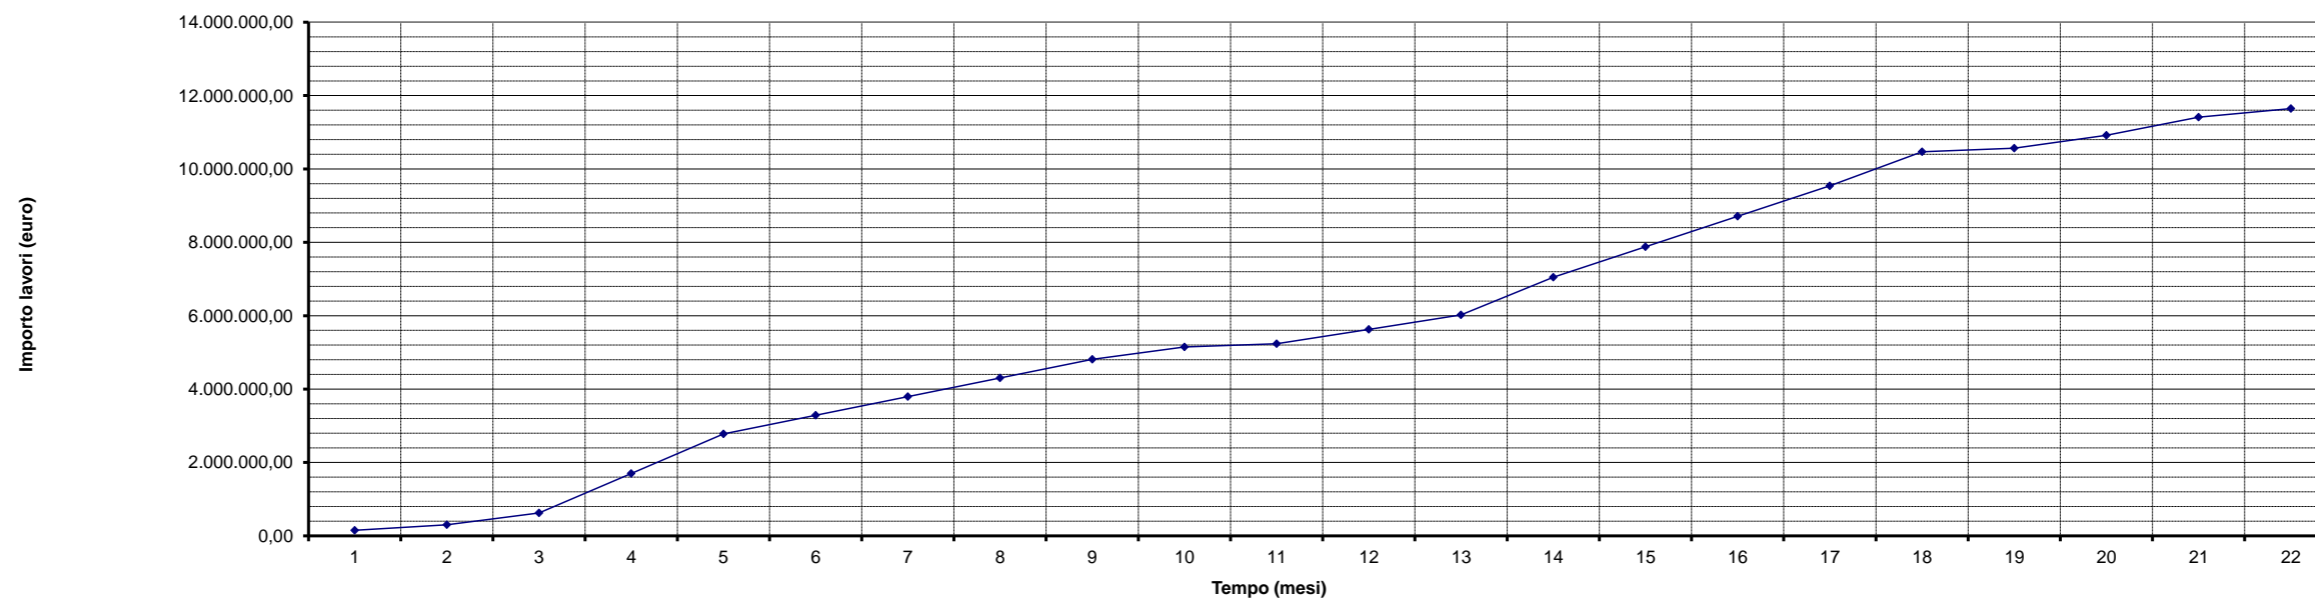

TEMPO CONTRATTUALE (mesi):	26
ACCANTIERAMENTO E FERIE (mesi):	2
PERIODO DI ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE (mesi):	2
PERIODO LAVORATIVO (mesi):	22
